

프로젝트 관리 시스템(PMS) 매뉴얼 및 업무절차 (ver.1)

[팀장, 부서장, PM용]

◆ 목차 ◆

1. PMS 접속방법

- 1) 로그인 아이디/비밀번호
- 2) 문의처

2. 계약 절차

- 1) 프로젝트 생성 방법
- 2) 첨부파일 등록 및 확인
- 3) 착수계 관련 서류 요청 방법
- 4) 산출내역서

3. 협력업체(하도급) 관리

- 1) 품의서 작성 방법
- 2) 협력업체(하도급) 계약 정보 확인
- 3) 지출결의서

4. 실행계획

- 1) 수립 방법
- 2) 작성 오류 사례

5. 대금청구

- 1) 청구 시 확인 및 공유사항(PM)
- 2) 선금 청구 시 참고 사항
- 3) 수금/지급 확인


6. 업무일지

- 1) 업무일지 작성
- 2) 업무일지 관리

7. 기타

- 1) 손해배상공제증권
- 2) 실적증명

1. PMS 접속 방법

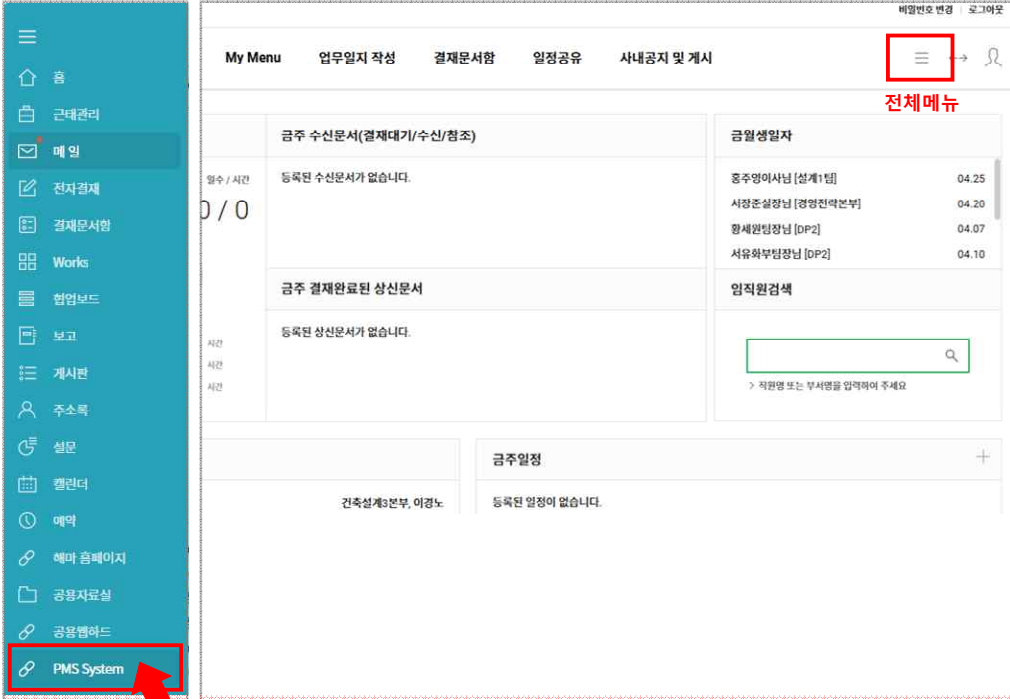

①PMS 접속

②PMS 메인화면

1) 로그인 정보: 다우오피스 계정과 동일

아이디 : 다우오피스 아이디 (이니셜+내선번호)
패스워드 : 다우오피스 최초 비밀번호(통합 패스워드)

2) 문의처: 프로젝트관리팀

담당자	연락처	담당 업무
유은영	02-2086-3907	일반건축/주거(LH)와 프로젝트 관리, 협약, 실행계획
김혜주	02-2086-3910	협력업체(하도급) 관리, 업무일지
송창민	02-2086-3908	일반건축/주거(LH) 프로젝트 관리, 착수계, 비밀번호

2. 계약 절차

1) 프로젝트 생성 방법 (부관사로 계약 된 프로젝트는 프로젝트관리팀에서 생성)

(1) 메뉴 접속

전체메뉴

● 메뉴목록의 별이 아이콘을 클릭하시면 My Menu의 메뉴가기 메뉴로 등록되며, 최대 15개까지 선택이 가능합니다.(일부메뉴는 메뉴가기 기능이 제공되지 않습니다.)

● 우측상단의 X자 아이콘을 클릭하시면 전체메뉴 화면을 닫을 수 있습니다.

시스템 관리

현황조회

프로젝트

업무일지

실행정보

결재문서함

사용자관리

계획대비실행현황

프로젝트정보관리

업무일지 작성 및 조회

외주비기성확인원

환경설정

사용자관리

부서별

프로젝트정보관리

업무일지 작성

일지별

결재문서등록

★

그룹관리

프로젝트별

실행계획수입

프로젝트업무시간일괄배정

프로젝트별

결재완료문서조회

★

메뉴별관리자권한지정

★

실행기간 및 진행률관리

★

업무일지 조회

★

시내정보관리

★

프로젝트정보관리

Home > 프로젝트 > 프로젝트정보관리

년도

전체

상태

전체

유형

종도

계약여부

전체

건축면적

0.00 ~ 0.00

검색조건

프로젝트명

검색어

Search

Total: 182

page: 1 / 7

페이지당 30개

프로젝트

유형

주관부서

담당PM

상태

여부

비율

Pj No.

프로젝트명

2025-016

(가칭)관내3중학교 신축공사 설계용역

전략기획3본부

김재관

진행

계통

110%

2025-015

[HM-25005-D]관포 산포 디퍼아울렛 도시개발사업 사업제안 기본 중안 실시설계

민간

복합개발사업부서

김민구

진행

계통

110%

프로젝트 기본정보

년도

2025년

프로젝트번호

2025-017

상태

진행

프로젝트명 *

간접비율 *

적률

110 %

실행계획변경여부

신규상설으로 인한 변경가능

진행률수정여부

전체수정

업무일지선택 사용자범위 *

전직원 선택가능

주관부서 *

담당PM *

프로젝트유형

종도

규모

구조

건축면적(m²)

대지면적(m²)

연면적(m²)

발주처

담당자(발주처)

연락처(발주처)

위치

★ 프로젝트 관련 필요사항 ★

< 공동, 분담업체 - '계약일' 작성 > - 현상/실시 계약

프로젝트 진행단계

신역

순번

1 단계

(2) 필수 입력 항목

- 프로젝트명, 주관부서, 담당PM, 업무일지선택 사용자범위
- 프로젝트 진행단계 : 제안, 현상(기본설계) / 당선 및 실시계약(실시설계)

(3) 프로젝트 관리 번호

- 프로젝트 생성 후 계약담당자에게 관리 번호 부여 요청
- 프로젝트 관리번호 : HM-25000-D / A / C
(연도)(순번)(D:현상,기술제안 / A:실시설계 / C:협약)

(4) 참고 사항

- 프로젝트 생성 권한 : PM
- 프로젝트 생성 시 투입 인원들에게 공유 필수
(프로젝트가 생성되었으나 업무일지에 기타 프로젝트로 작성하는 경우 다수)

(5) 정보 공유

실시 PM은 계약 체결 전 현상프로젝트 내 첨부파일에서 용역 기초정보 확인 가능
(ex. 공고서, 공모지침서, 과업지시서 등)

2) 프로젝트 첨부파일 등록 및 확인

프로젝트정보관리

Home > 프로젝트 > 프로젝트정보관리

프로젝트명

[2025-012] [HM-25002-A] (가칭)함양1초등학교 신축공사 설계용역

담당PM

유종범

기본정보

프로젝트진행단계

부서배분

첨부파일

> 첨부파일 용량은 파일당 최대 20MB까지 업로드가 가능합니다.

> 기초첨부파일 삭제는 삭제하려는 파일 좌측 선택박스를 체크하신 후 지점하시면 삭제됩니다.

첨부파일

6개 / 14.95 MB

삭제

0 원상(가칭)함양1초등학교 신축공사(재안도) (원시02.21)(현제2 용량변) zip 10.12 MB

[25.03.26 최종제안 1.지문용(합량1.총) pdf 48.86 KB

- (1) 현상(기본)/기술제안 단계 : 공고문, 협정서, 과업지시서 (프로젝트 생성 시 등록)
- (2) 실시단계 : 분담업체 견적서, 산출내역서(금액확정서)
- (3) 프로젝트관리팀 : 계약서, 지분율표, 보증서, 계약전자첨부분서(계약완료시)

(1) 요청방법

(1) 요청방법

(2) 입력 항목

착수일(작성일) / 요청 서류명 / 필요 부수 및 형태(원본/사본) / 제출기한

(3) 공유

발주처 제출 후 착수계 스캔본(PDF) 공유

담당자: 송창민 02-2086-3908(#108) (scm521@haemaarch.com)

(1) 자사 양식 사용 시

[다운로드 경로: 전체메뉴 → 커뮤니티 → 분야별 게시 → 양식]

- (2) 발주처 양식 사용 시

- ① PM은 발주처 샘플 수령
- ② PM은 산출내역서 작성 초안 및 발주처 샘플 계약담당자 공유 및 검토요청
- ③ 계약담당자 검토
- ④ 설계팀 발주처 제출

1) 품의서 작성 방법

(1) 품의서(최초) 주요 확인 사항

- (2) 품의서(변경) 주요 확인 사항

- ### (3) 협력업체(하도급) 계약 절차

- ## 2) 협력업체(하도급) 계약 정보 확인

PMS My Menu 업무일지 작성 결재문서함 일정공유 사내공지 및 게시

외주계약관리

Home > 프로젝트 > 계약관리

계약정보	지출계획	첨부파일
-------------	------	-------------

> 해당 계약정보에 외주비영수 또는 외주배가청취이유 정보가 있을 경우 하자로 표시된 계약금액은 영수금과 영수 배가처분확정금액보다 작게 수정할 수 없습니다.

> 계약금 지급이 완료되면 계약금 잔액(잔액)을 입력하십시오.

① 계약금액 확인
② 계약서 첨부

기본값: 프로젝트 ▶ 어주시 신청사 건설사업 기본발계통역

메모	

(1) 최초 작성

- (2) 결재 순서

- ② 담당자 검토 후 결재용(서식)을 PM 또는 본부장에게 전달

- ### (3) 참고사항

- 지급일자 확인 경로 : PMS → 현황조회 → 실행현황 → 외주용역비(지출현황 일자)

- 지급 증빙 요청시 협력업체 담당자에게 요청

4. 실행계획 (매출이 발생하는 모든 프로젝트 해당)

1) 실행계획 수립 방법

(1) 전체메뉴 → 프로젝트 → 프로젝트 정보관리 → 실행계획수립 → 일정입력(저장) → 인건비산정(저장) → 협력업체 계약 금액 입력(저장) → 마감 →결재

실행계획수립

Home > 프로젝트 > 프로젝트정보관리

프로젝트명

[2025-011] [HM-25001-A] [서울계보 아카데미집 구조개선 및 분려수거장 산원 설계용역]

프로젝트진행단계별 일정계획

프로젝트진행단계별 비용계획

실행계획 History

프로젝트진행단계별 일정계획 수립

진행단계

일정계획 +

1단계

총차

일정계획

~

저장

다시작성

목록

실행계획수립

Home > 프로젝트 > 프로젝트정보관리

프로젝트진행단계별 일정계획

프로젝트진행단계별 비용계획

실행계획 History

프로젝트진행단계별 비용계획 수립

프로젝트명

[2024-079] 나라키움 천안세곡 복합형사 산죽 설계용역

담당PM

조재범

발주처

한국자산관리공사 국유재산과

담당자

조재범

예산총액(금액)(VAT별도)(0)

799,093,636

직접인건비 **인건비 계획**

직접인건비계산

항수가

항식제

직급	기초급급액	총차		수계(2)	비율(20/1)	비고
		연원수	두여일(2459)			
☐ 사장	2024	0	1.0	0.0		
☐ 부총장	2024	0	1.0	0.0		
☐ 이사	2024	252,000	2.0	245.0	123,480,000	15.45%
☐ 실장	2024	219,000	1.0	245.0	53,655,000	6.71%
☐ 과장	2024	161,000	1.0	245.0	39,445,000	4.94%
☐ 사원	2024	119,000	2.0	245.0	58,310,000	7.30%

프로젝트명

[2024-079] 나라키움 천안세곡 복합형사 산죽 설계용역

프로젝트진행단계별 일정계획

프로젝트진행단계별 비용계획

실행계획 History

Total : 1

자수	작성일	작성자	예산총액(금액)	직접비			간접비		비율	백분율(100%)
				직접인건비	직접관리비	외주용역비	소계	간접비율		
1차	2025.01.15	유한영	799,093,636원	274,890,000원	0원	375,144,000원	650,034,000원	0%	0원	149,059,636

결재용 엑셀 다운로드

(2) 시기

- 수립시기 : 실시설계 계약일 ~ 착수일 이내
(계약담당자가 계약 완료 후 PM에게 별도 안내 예정)
- 수정시기 : 프로젝트 변동사항(투입인원,기간 등) 발생 시
 - ※ 절차 : ① 계약담당자에게 마감해지 요청(마감시 수정불가)
 - ② 수정 후 계약담당자에게 마감 요청
 - ※ 계약 금액, 협력업체 변동 시 프로젝트관리팀에서 수정 후 마감

(3) 일정 계획 기준

예시1) 계약서상 계약일 ~ 계약서상 준공일

예시2) 실제 업무 시작일 ~ 실제 업무 종료예정일

예시1), 예시2) 중 프로젝트 성격에 맞게 지정

※ 사후관리 기간은 일정에서 제외

(4) 인건비 계획 기준

- 실제 투입 인원으로 산정
- 해당 연도 직원별 투입일수 초과되지 않도록 지정

(5) 협력업체 계약 금액

- 협력업체 품의서 결재본 수령시 협력업체 관리 담당자 입력
- PM은 입력된 협력업체 정보 검토 필수

(6) 실행계획 결재

- 시기 : 협력업체 품의서 결재시
- 방법 : 결재용 엑셀 파일 출력(가로인쇄) 후 결재
(결재란은 우측 상단에 도장 날인)

(예시)

2) 작성 오류 사례 1 : 계획 대비 실제 투입 인원(인건비) 초과

계획대비실행현황(프로젝트별)

프로젝트명			
참여부서		담당PM	
예산용역금액	17,540,909(VAT별도)	계약금액	17,540,909(VAT별도)

항목	합계					
	계획		실행		차액	비율(㉔/㉓)
	금액㉑	투여일	금액㉒	투여일		
부문장			0	0.25	0	
본부장			34,045	0.13	-34,045	
이사	1,244,630	5	3,427,737	13.63	-2,183,107	275.40%
실장	2,119,980	10	3,683,000	16.75	-1,563,020	173.73%
팀장	744,348	4	3,366,375	17.63	-2,622,027	452.26%
대리			12,026,000	86.25	-12,026,000	
사원	3,488,670	30	7,570,994	63.38	-4,082,324	217.02%
직접인건비 합계㉓	7,597,628	49	30,108,151	198	-22,510,523	396.28%

(1) 문제점

- 실행계획 대비 인원(인건비) 과투입으로 인한 진행율 100% 초과
- 회계 감사 시 예산집행의 적정성 하락으로 지적대상이 될 수 있음

(2) 사유

- 업무일지가 해당 프로젝트로 과투입된 경우
- 계약금액 대비 실행계획 금액이 낮은 경우
- 용역 중지 또는 사후관리에 투입되는 인건비가 과도한 경우

(3) 해결방안

- PM이 해당 프로젝트 인원 투입 통제
- 실행계획 재수립 (투여일 또는 인원)
- 해당 연도 기준급여로 수정 (기준급여 매년 업데이트)

* 회계 감사 시 매출 산정 예시

용역명	계약금액	실행계획	진행율 (실제투입/실행계획)	매출차액	
XX 설계용역	1,000,000	실행계획 인건비	136%	실제매출	계산서발행 매출
		300,000		700,000	
		실제투입 인건비		진행율에의한 매출	계약금액 초과
		410,000		1,360,000	

※ 회계 감사 시 진행율에 의한 매출 산정으로 실제 매출 외의 금액은 선수금
으로 반영 → 법인세 증가

2) 작성 오류 사례 2 : 계획 대비 실제 투입 인원(인건비) 미달 (준공시 해당)

계획대비실행현황(프로젝트별)						
프로젝트명						
참여부서			담당 PM			
예산용역금액	1,149,112,364(VAT별도)		계약금액	1,149,112,364(VAT별도)		

항목	합계					
	계획		실행		차액	비율(②/①)
	금액①	투여일	금액②	투여일		
부문상			209,790	0.75	-209,790	
본부장			1,396,550	5.13	-1,396,550	
이사	196,900,466	791	19,319,442	77.88	177,581,024	9.81%
팀장			9,200,625	50.63	-9,200,625	
부팀장	127,320,942	791	8,530,986	53	118,789,956	6.70%
대리			3,005,065	21.31	-3,005,065	
사원	91,984,599	791	21,485,662	183.06	70,498,937	23.36%
직접인건비 합계③	418,206,007	2,373.00	63,149,120	391.75	355,057,887	15.17%

(1) 문제점

- 실행계획 대비 인원(인건비) 미투입으로 인한 진행율 100% 미만
- 공정을 100% 이후에도 계약금액 100% 매출 처리 불가

(2) 사유

- 업무일지 미작성한 경우
- 계약금액 대비 실행계획 금액이 높은 경우
- 실행계획 인원이 실제로 투입되는 인원보다 많을 경우

(3) 해결방안

- PM이 해당 프로젝트 업무일지 작성을 관리
- 실행계획 재수립(투여일 또는 인원)

* 회계 감사 시 매출 산정 예시

용역명	계약금액	실행계획	진행율 비율 (실제투입/실행계획)	매출차액	
XX 설계용역	1,000,000	실행계획 인건비	50%	실제매출	계산서발행 매출
		300,000		1,000,000	
		실제투입 인건비		진행율에의한 매출	계약금액 미달
		150,000		500,000	

※ 회계감사 시 진행율에 따른 매출 산정으로 실제 매출 금액에서 차액분은
외상 매출로 반영 → 매출 감소로 인한 재무제표 및 신용평가 악영향

6. 업무일지

1) 업무일지 작성

(1)메뉴접속

PMS

My Menu

①

업무일지 작성

결재문서함

일정공유

사내공지 및 게시

≡

↔

🔍

업무일지작성

Home > 업무일지

업무일지작성

업무일지조회

> ▲표시가 나타난 날짜는 출퇴근시간에 의해 계산된 근무시간보다 업무일지의 입력된 근무시간이 준정우이므로 업무일지수정이 필요합니다.(단, 관리자가 프로젝트 업무시간 일괄(배정) 변경은 표시되지 않습니다.)

> 휴직일 및 휴일표가 있을 업무일지를 작성할 수 없습니다.(미작성일에서 제외됩니다.)

> 발행정보가 없는 인원의 경우 미작성일이 표시되지 않습니다.(미작성일은 발행정보와 연동됩니다.)

2022년 4월

일요일 3/27

화요일 3/28

수요일 3/29

목요일 3/30

금요일 3/31

토요일 4/1

일요일 4/2

3

4

5

6

7

8 ②

9

10

11

12

13

14

15

16

업무일지작성

Home > 업무일지

> 정규시간은 8.00시간 이상 입력할 수 있으며, 특근시간은 12.00시간 이상 입력할 수 없습니다.

> 업무일지 유형이 프로젝트인 경우 프로젝트선택은 필수이며, 첨부파일은 파일당 최대 10MB까지 업로드가 가능합니다.

> 관리자가 프로젝트업무시간일괄배정한 달은 수정 또는 삭제할 수 없으며, 업무일지 입력가능한 정규 및 특근시간 계산에서도 제외됩니다.

작성일 < 2022.04.01 >

출퇴근시간 (정규시간 : 설정시간 기준 / 특근시간 : 입력시간 기준)

> 출근시간 : --:-- / 퇴근시간 : --:-- (정규시간 : --시간 / 특근시간 : --시간)

업무일지 작성

발추가

발삭제

선택

구분

프로젝트

업무내용

정규시간

특근시간

유형

업무구분

발달

발삭

☐

프로젝트

프로젝트진행

(2)업무일지 작성 방법

- ① 당일 작성 원칙 (단, 출장/휴무 시 익일 작성 가능)
- ② 프로젝트 구분 :
 - 프로젝트 관련 업무 수행시

구분		프로젝트	업무구분	정규시간
유형	업무구분			
프로젝트	프로젝트진행	해당 프로젝트 선택	*****업무	5
프로젝트	프로젝트진행	기타프로젝트(업무일지용)	0000용역 *****업무	3

※ 21년 6월 이전 계약 프로젝트는 미등록 상태이므로 ‘기타프로젝트(업무일지용)’로 사용
※ ‘기타프로젝트(업무일지용)’ 업무구분 프로젝트명 작성 시 계약서상 전체 프로젝트명 작성 및 특수문자 사용 금지

- 프로젝트 외 업무 수행시(반차,연차,공가,워크샵 등)

구분		프로젝트	업무구분	정규시간
유형	업무구분			
프로젝트외	년차/휴가	-	-	8

- ③ 시간배분
정규: 8시간 고정 (8시간 내에서 시간 배분)
특근: 비활성(작성금지)

2) 업무일지 관리

(1) 매일 관리(PM)

업무일지조회

Home > 업무일지

> 작성일은 필수 검색조건이며, 검색어가 없는 경우 최대 3개월, 검색어가 있는 경우 최대 6개월까지 선택이 가능합니다.

> 검색결과가 많은 경우 다수 시간이 소요될 수 있습니다

작성일2025.01.20 ~ 2025.01.23

원부시전제

유형전제

업무구분

검색조건작성자

검색어

Q Search

Total : 198

작성일	원부시	원직급	작성자	유형	업무구분	프로젝트			업무내용	
						Pj No	프로젝트명	발주처		
2025.01.23	설계1팀	팀장	김윤선	프로젝트	프로젝트전행	2024-040	(가칭)미사4고 신축 설계영역	경기도광주해남교육지원청	총차	1.설치설계 넘김도시 준비 2.발주처 요청사항 답변 및 내역 수정 3.설계안전상감도 진행 4.BF에비안송 진행
				소계						
				프로젝트	프로젝트전행	2024-011	합천.장남간 합천지사 신축 설계영역	한국도로공사	총차	-전문업체 상해도 수정사항 반영
2025.01.23	설계3팀	대리	조혜지	소계						
				* 추가공정, 회한 및 3월						

① 프로젝트 업무일지 관리 항목

- 유형, 업무 구분, 프로젝트, 업무내용 입력 정보
- 오입력 사례 1. PMS에 등록된 프로젝트이나 “기타프로젝트”로 작성하는 경우,
- 오입력 사례 2. 공가(프로젝트휴가)를 프로젝트외/년차,휴가로 작성하지 않고 프로젝트 관련 업무수행으로 작성하는 경우
- 오입력 사례 3. 기타프로젝트(업무일지용) 업무일지 작성시 계약서상 프로젝트명과 상이하게 작성하는 경우

(2) 매월 관리(본부장)

정규현황(부서별)

Home > 업무일지 > 업무일지작성현황

년도별현황

월별현황

> 기준시간은 휴직일을 제외한 평일일수8시간으로 계산합니다.

> 기준시간은 발령정보의 입사일과 퇴사일을 고려하여 산정되므로, 발령정보가 없거나, 기준년월 이전에 퇴사하거나 기준년월 이후에 입사한 임직원의 경우 목록에 표시되지 않습니다.

> 작성시간은 업무일지작성 시 입력한 정규시간의 해당월의 합계입니다.

기준년2025년

기준월01월

부시전제

검색조건이름

검색어

Q Search

Total : 191

구분			프로젝트				소계	경영/기력/연사	전산관리/자료관리
이름	원부시	원직급	기준시간	프로젝트전행					
전권석	대표이사	대표이사	144.00				0.00		
홍성현	경영전략본부	사장	144.00				0.00		
추기재	전략설계부	사장	144.00				0.00		
김영구	복합개발사업부	사장	144.00				0.00		
이은석	전략사업부	사장	144.00				0.00		
정규화	전략사업부	부사장	144.00				0.00		

① 관리 항목

- 매월 업무일지 작성율
- 실행계획 대비 진행율

7. 기타

1) 손해배상공제증권

- PM: 공제기간, 제출 방식(원본/스캔본), 제출기한 확인 후 발급 요청

2) 실적증명

(1) 신청사유 : 실적관리, 입찰서류 용도

(2) 필요서류 : 건축허가서, 건축개요 등

※건축 허가서와 건축개요 정보가 상이한 경우 사유 확인 후 공유

(3) 발급절차

- 발급 전 공유사항

PM은 준공 납품시 프로젝트관리 담당자에게 필요서류 공유

(미발급시 발급 가능 일정 공유)

- 서면 발급 시: ① 프로젝트관리 담당자 실적증명서 초안 작성 후 PM 전달

② PM 발주처 감독관(또는 담당자) 날인 요청 및 수령

- 전자 발급 시: 프로젝트관리 담당자 시스템으로 발급

